

令和 6 年度の養浜工事について

1. 極楽寺川周辺の変遷



図1 極楽寺側周辺の変遷

2. 令和6年度の養浜工事について

養浜計画（令和7年2～3月施工予定）

工事延長 $L = 130 \sim 140\text{m} \Rightarrow 80 \sim 140\text{m}$

養浜工 $V = \text{約}2,000\text{m}^3$ (仮設通路工 $V = \text{約}500\text{m}^3$ 含む) $\Rightarrow \text{約}1,500\text{m}^3$ (仮設通路工 含む)

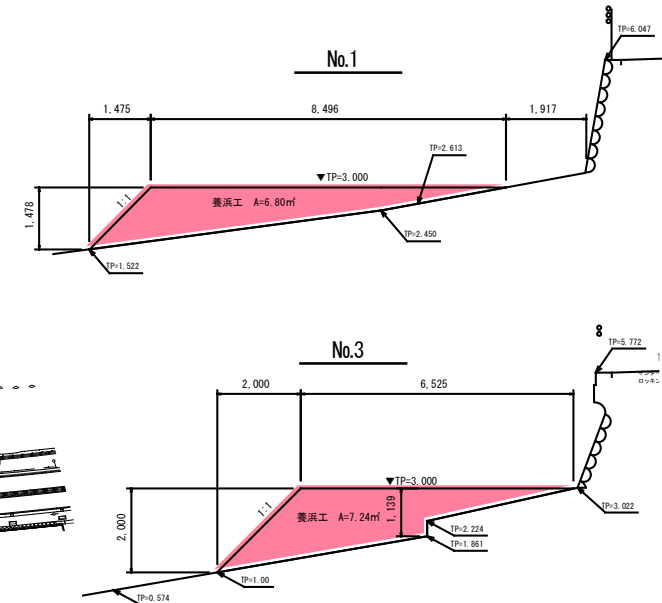
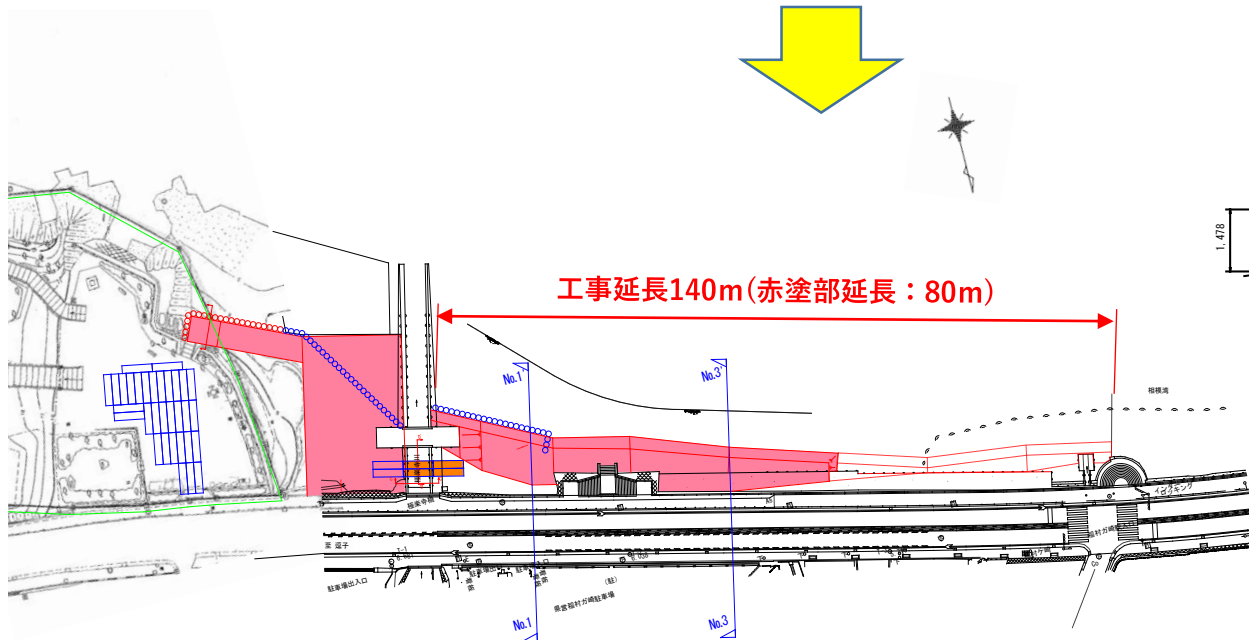
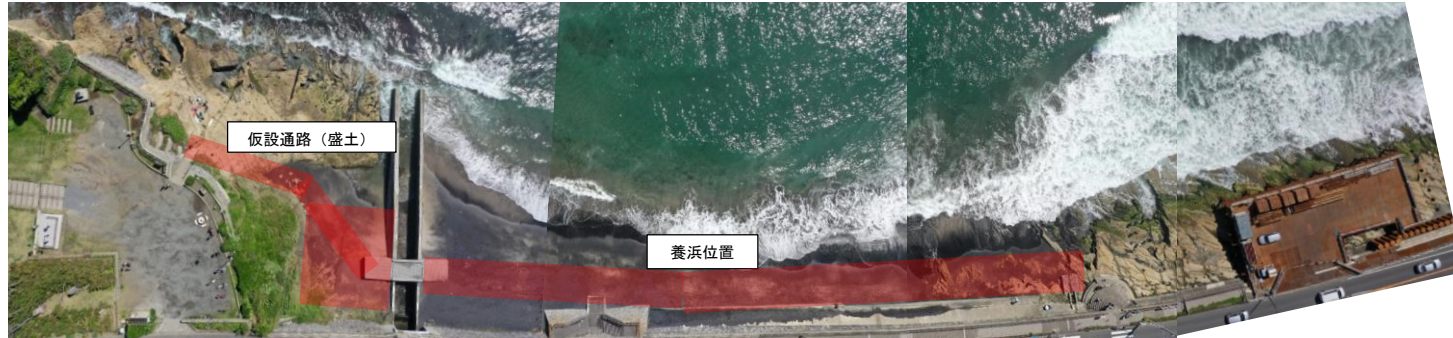




図2 令和6年度の養浜位置及び断面

3. 養浜材について

令和6年10～11月に境川の上山本橋付近(片瀬1丁目)の浚渫砂を、令和6年12月までに茅ヶ崎市柳島の養浜材のストック場に運搬し、振るい(石の除去)をした後に稲村ヶ崎公園から搬入する。

【養浜材（中央粒径）】


地点	中央粒径 d ₅₀	備考
境川(片瀬1丁目)No.167	1.6mm	2024年9月17日採取
境川(片瀬1丁目)No.175	1.6mm	2024年9月17日採取
柳島ストック場 No.1	7.1mm	2025年1月29日採取
柳島ストック場 No.2	6.6mm	2025年1月29日採取

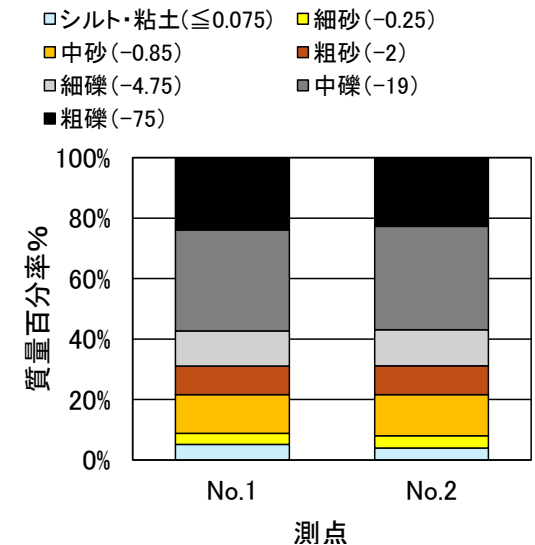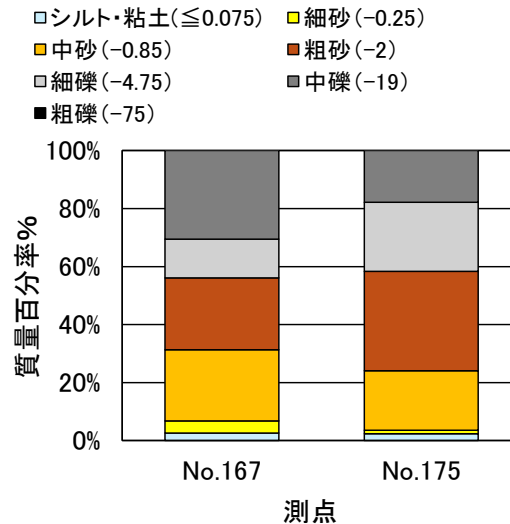

R6境川浚渫 工事箇所



境川採取箇所(No.167)

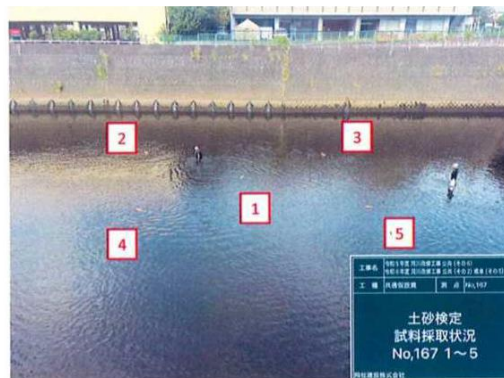

柳島ストック場採取箇所(No.1)

