


産業廃棄物発生フロー

(別表-1)


建物新築工事（一般的な建築作業所での産業廃棄物発生フローを示す）

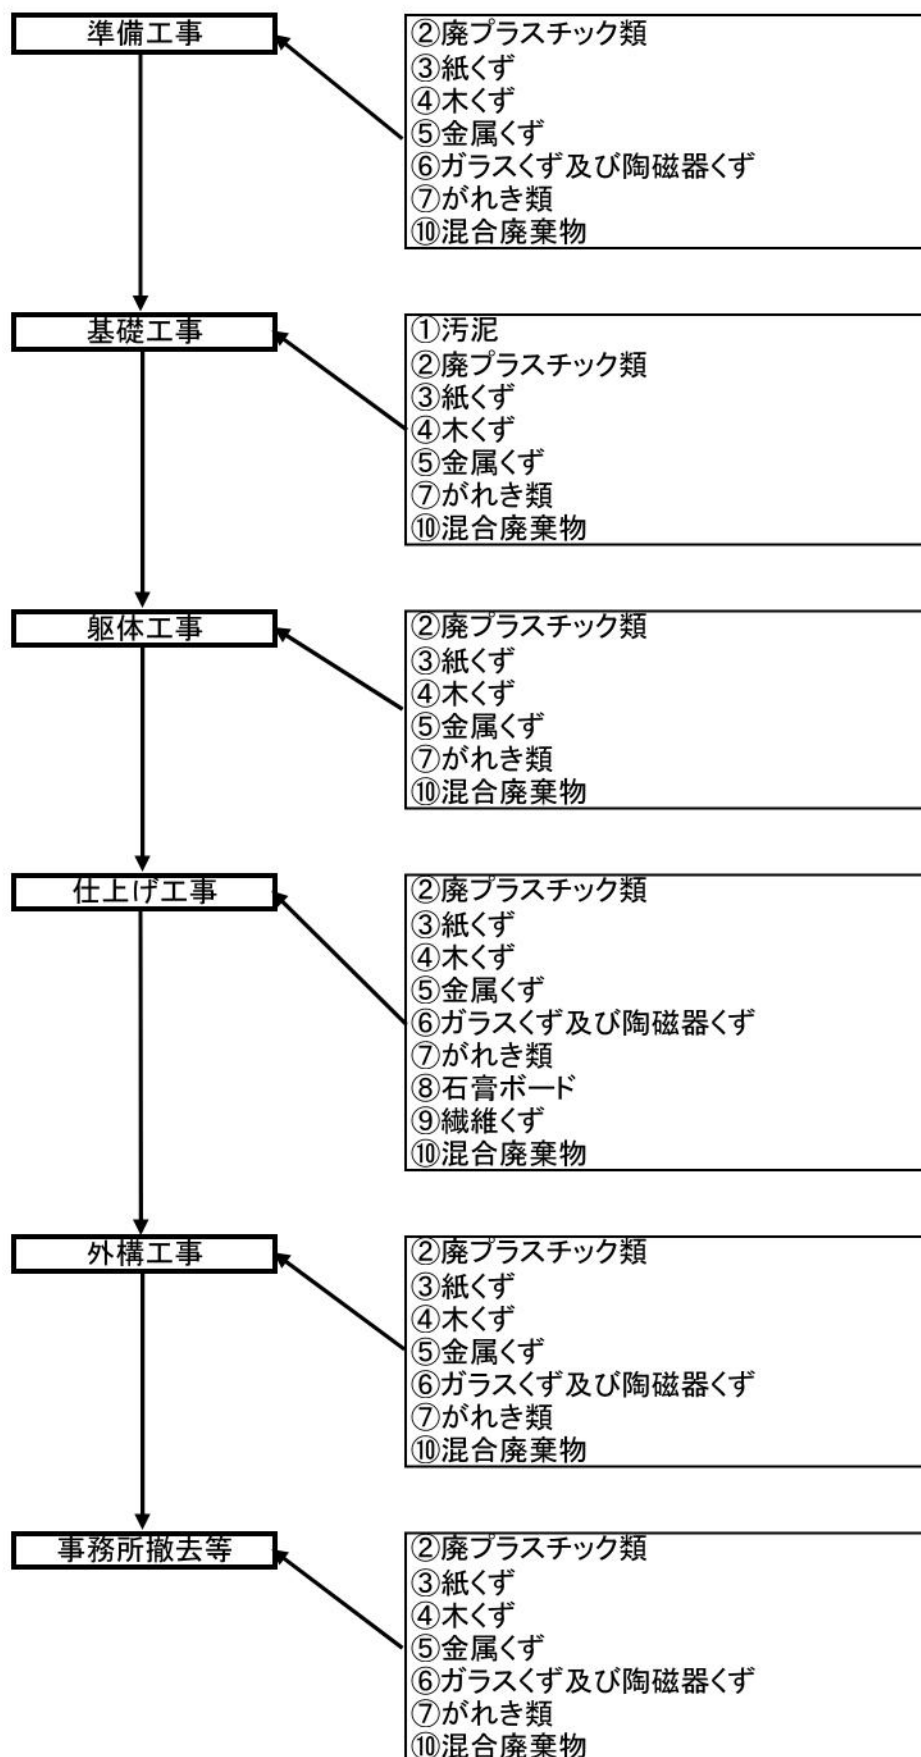

処理等工程図

廃棄物種類	処理工程
① 汚泥	収集運搬→委託処理【中間処理(脱水・凝集固化、天日乾燥)】 →再生(建設資材)
② 廃プラスチック類	収集運搬→委託処理【中間処理(破碎・圧縮)】 →再生(原料・燃料)→最終処分(安定型埋立)
③ 紙くず	収集運搬→委託処理【中間処理(破碎・圧縮)】→再生(原料)
④ 木くず	収集運搬→委託処理【中間処理(破碎・圧縮)】→再生(原料)
⑤ 金属くず	収集運搬→委託処理【中間処理(破碎)】→再生(原料)
⑥ ガラスくず及び 陶磁器くず	収集運搬→委託処理【中間処理(破碎)】 →再生(原料・建設資材)→最終処分(安定型埋立)
⑦ がれき類	収集運搬→委託処理【中間処理(破碎)】→再生(建設資材)
⑧ 石膏ボード	収集運搬→委託処理【中間処理(破碎)】→再生(原料)
⑨ 繊維くず	収集運搬→委託処理【中間処理(破碎・圧縮)】→再生(原料・燃料)
⑩ 混合廃棄物	収集運搬→委託処理【中間処理(破碎)】 →再生(原料・燃料)→最終処分(管理型埋立)

(別表 3) 建設副産物対策管理組織

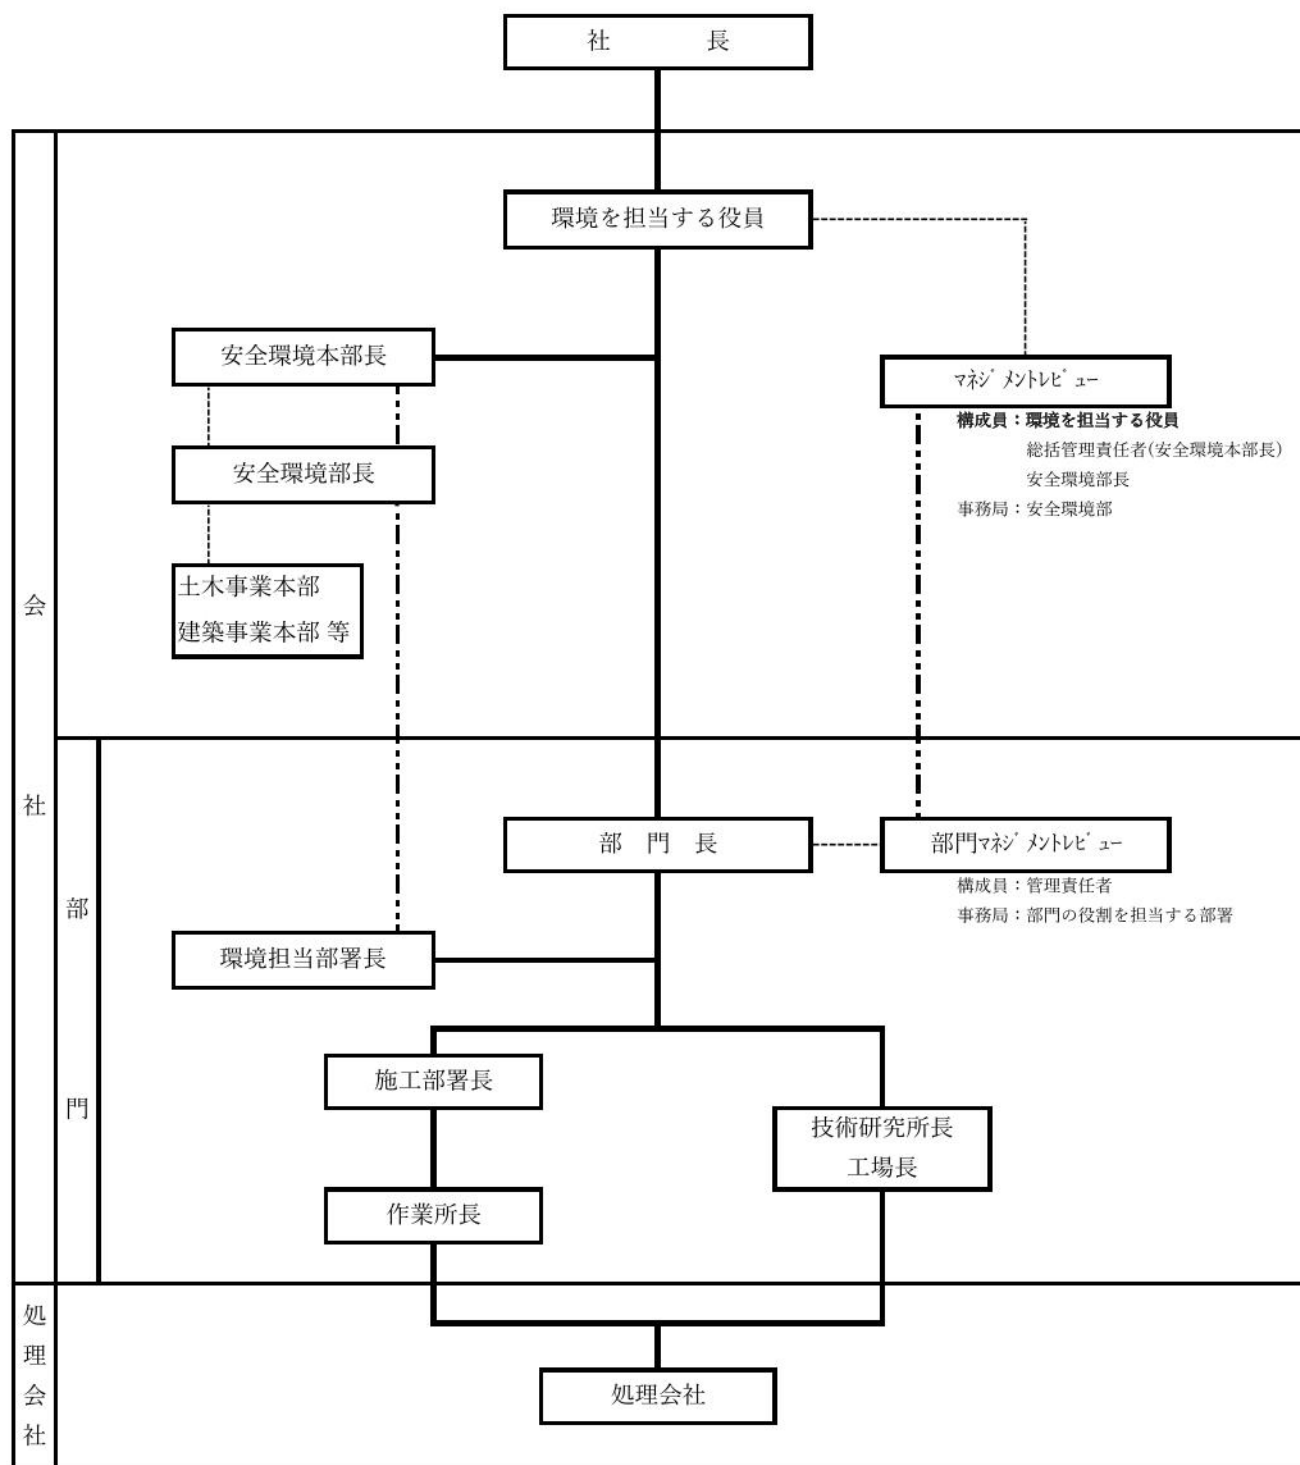

—— 指示系統
----- 審議系統
- . - . - 連絡系統
