


矢上川地下調節池トンネル本体Ⅰ期工事 地表面変位測定結果のお知らせ

測定日：12月10日(水)

シールドマシン周辺の地表面変位測定の結果

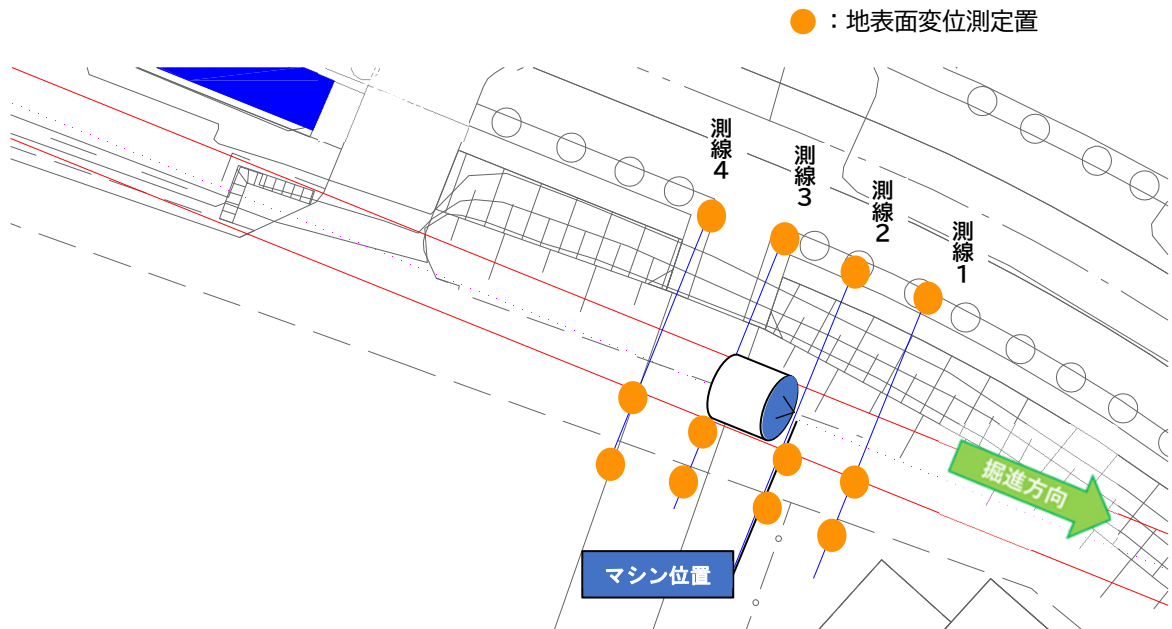

◆測定結果

測線	初期値 (m)	測定値 (m)	最大鉛直変位 (mm)
1	21.853	21.851	- 2
2	15.655	15.653	- 2
3	15.575	15.573	- 2
4	15.421	15.420	- 1

※上表は、各測線のうち、鉛直変位の最大値を示しています。
