


矢上川地下調節池トンネル本体 I 期工事 地表面変位測定結果のお知らせ

測定日：5月12日(火)

シールドマシン周辺の地表面変位測定の結果

●：地表面変位測定置

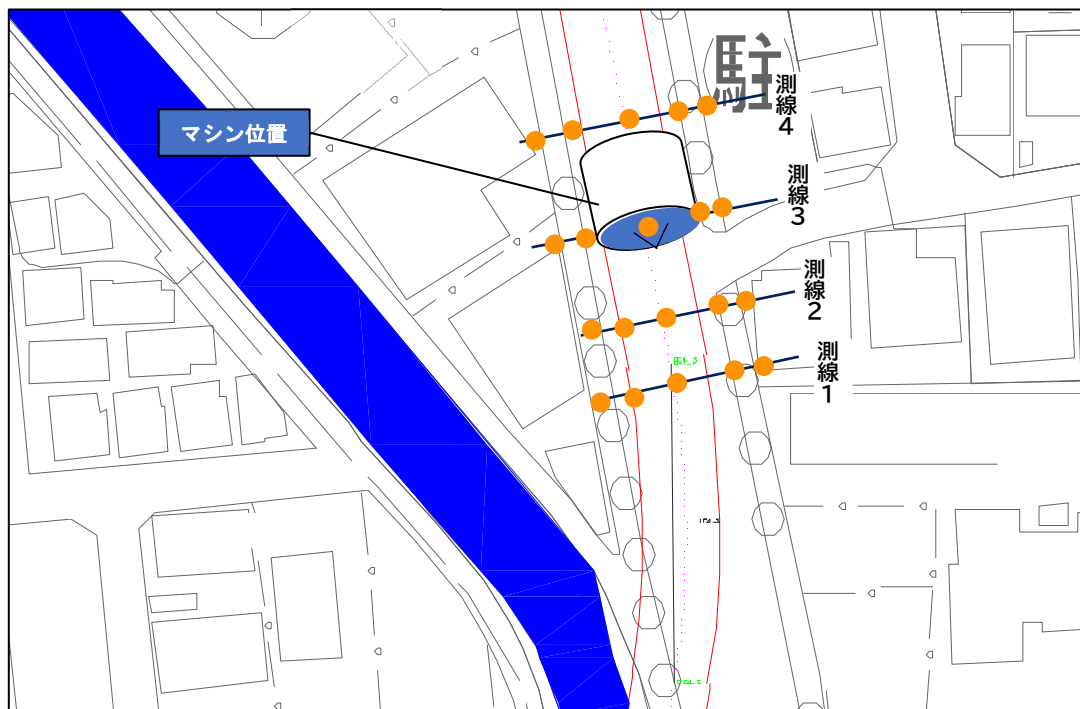

◆測定結果

測線	初期値 (m)	測定値 (m)	最大鉛直変位 (mm)
1	12.050	12.048	-2
2	12.170	12.169	-1
3	12.329	12.328	-1
4	12.560	12.558	-2

※上表は、各測線のうち、鉛直変位の最大値を示しています。
