


矢上川地下調節池トンネル本体Ⅰ期工事 地表面変位測定結果のお知らせ

測定日：5月20日(火)

シールドマシン周辺の地表面変位測定の結果

●：地表面変位測定位置

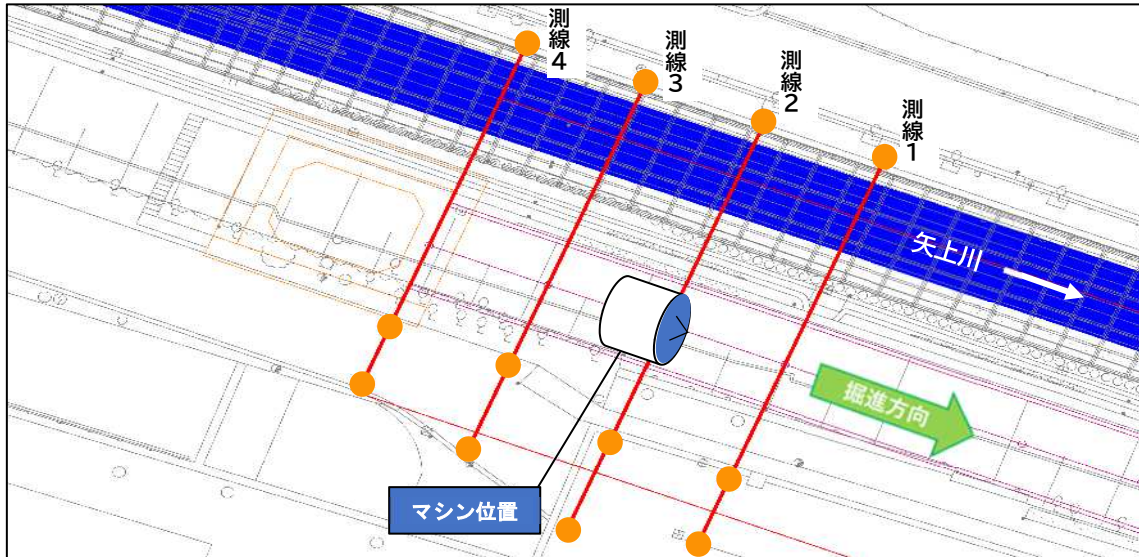

◆測定結果

測線	初期値 (m)	測定値 (m)	最大鉛直変位 (mm)
1	15.797	15.798	+1
2	21.805	21.803	-2
3	15.895	15.897	+2
4	15.842	15.844	+2

※上表は、各測線のうち、鉛直変位の最大値を示しています。
